



Rollgerüste Checkliste

Wie sicher arbeiten Sie und Ihre Mitarbeitenden mit dem Rollgerüst?

Ein Sturz vom Rollgerüst hat meistens schwerwiegende Folgen. Darum lohnt es sich, hier den Hebel anzusetzen.

Die Hauptgefahren sind:

- Absturz bei Montage, Demontage und Benutzung
- Umstürzen des Rollgerüsts
- Bruch des Belags

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

1. Füllen Sie die Checkliste aus.

Wo Sie eine Frage mit «nein» oder «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen. Notieren Sie die Massnahmen auf der letzten Seite. Sollte eine Frage Ihren Betrieb nicht betreffen, streichen Sie diese einfach weg.

2. Setzen Sie die Massnahmen um.

Planung und Arbeitsvorbereitung (AVOR)

- | | |
|---|--|
| 1 Ist das Rollgerüst für den geplanten Arbeitseinsatz das geeignete Arbeitsmittel? | ☐ ja
☐ nein |
| 2 Ist für den Arbeitseinsatz ein sicheres und korrektes Rollgerüst im Betrieb vorhanden?

Auch wenn das Rollgerüst gemietet wird, ist darauf zu achten, dass es sicher und geeignet ist. | ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein |
| 3 Ist das Rollgerüst, das verwendet werden soll, in einwandfreiem Zustand?

Besonders zu beachten sind: <ul style="list-style-type: none">• Tragkonstruktion• Rollen mit Arretierung• Gerüsttreppenaufstieg und Gerüstbeläge• 3-teiliger Seitenschutz (inklusive Bordbrett) | ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein |
| 4 Ist die notwendige Nutzlast für den Arbeitseinsatz bekannt?


Die Angaben zur Nutzlast des jeweiligen Rollgerüsttyps sind in der Montageanleitung (Herstellerangaben) zu finden. | ☐ ja
☐ nein |
| 5 Wird nach Möglichkeit ein Rollgerüst mit Treppenaufstieg (statt Leiternaufstieg) verwendet?

Besonders bei grossen Rollgerüsthöhen bieten Gerüsttreppen optimale Sicherheit. Leitern sind keine sicheren Zugangsmittel. | ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein |
| 6 Wird vorzugsweise ein Rollgerüst eingesetzt, bei dem die Montage und Demontage gesichert erfolgen kann? (Bild 2)

Es ist darauf zu achten, dass die Montage und Demontage ab einer Absturzhöhe von 2,0m zu jedem Zeitpunkt gesichert erfolgt (BauAV Art. 23). Dabei sind die Herstellerangaben zu beachten. | ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein |



1 Der Arbeitseinsatz mit dem Rollgerüst muss geplant werden.

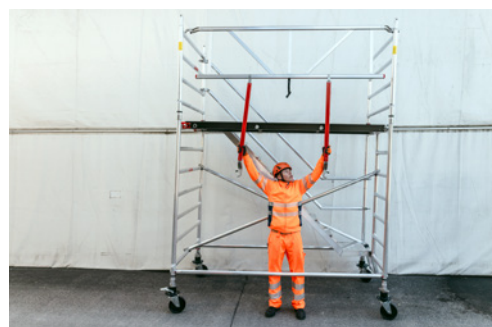


2 Die Montage und Demontage erfolgt gesichert mit einem Kollektivschutz (vormontierter Seitenschutz).



3 Das Rollgerüst steht auf einer tragfähigen Unterlage.

Montage und Benützung

- | | |
|---|--|
| 7 Wird die Montage und Demontage gesichert und gemäss Aufbau- und Verwendungsanleitung (Herstellerangaben) ausgeführt? | ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein |
| 8 Wird das Rollgerüst immer auf eine tragfähige Unterlage gestellt? (Bild 3) | ☐ ja
☐ nein |

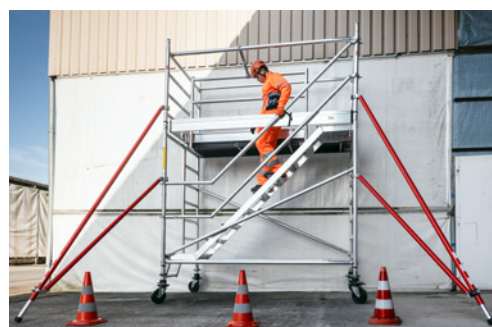

4 Ein Rollgerüst mit Gerüsttreppe bietet optimale Sicherheit.

- 9 Ist die Stabilität des Rollgerüsts gemäss Herstellerangaben gewährleistet?

Wenn nötig vorgegebene Hilfsmittel wie Verbreitungs-traversen und Ausleger verwenden.

- ☐ ja
☐ nein

- 10 Werden die Fahrrollen-Bremsen vor dem Besteigen arretiert? (Bild 5)

- ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein

- 11 Wird beim Besteigen ausschliesslich die in den Herstellerangaben vorgesehene Zugangsart benutzt (innerhalb des Gerüsts)?

Gerüsttreppen sind gegenüber einer schrägen oder vertikalen Leiter klar zu bevorzugen.

- ☐ ja
☐ nein

- 12 Wissen alle Mitarbeitenden, wie hoch das Rollgerüst maximal gebaut werden darf?

Besonders bei grossen Höhen sind zwingend die Vorgaben gemäss Aufbau- und Verwendungsanleitung (Herstellerangaben) zu berücksichtigen. In jedem Fall beträgt die maximale Standhöhe im Aussenbereich 8 m und im Innenbereich 12 m.

- ☐ ja
☐ nein

- 13 Wird das Rollgerüst nur dann verschoben, wenn sich darauf keine Personen befinden? (Bild 6)


- ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein

- 14 Wird das Rollgerüst gesichert, wenn es in der Nähe von Fahrzeugen oder in Durchgangsbereichen steht?

- ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein



5 Um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern, müssen die Rollen gesichert sein.

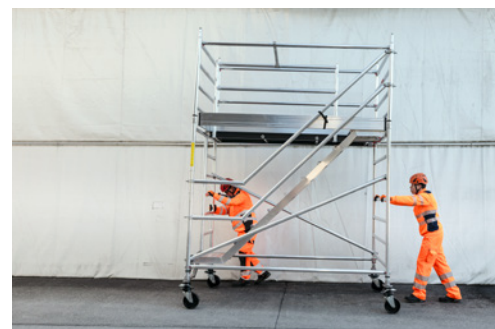

6 Das Rollgerüst darf nur verschoben werden, wenn sich keine Personen darauf befinden.

Instruktion und Instandhaltung

- 15 Werden die Mitarbeitenden in Ihrem Betrieb (besonders Neueintretende) nachweislich in der richtigen Handhabung der Rollgerüste instruiert?

Der korrekte Aufbau des Rollgerüsts ist der Aufbau- und Verwendungsanleitung (Herstellerangaben) zu entnehmen.

- ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein

- 16 Ist in Ihrem Betrieb klar festgelegt, wer die Rollgerüste regelmässig auf Mängel und Beschädigungen kontrolliert?

- ☐ ja
☐ nein

- 17 Wissen die Mitarbeitenden, dass sie Mängel am Rollgerüst sofort der vorgesetzten Person melden müssen?

- ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein

- 18 Ist sichergestellt, dass die Aufbau- und Verwendungsanleitung (Herstellerangaben) vorhanden ist?

Wenn die Aufbau- und Verwendungsanleitung fehlt, ist beim Hersteller danach zu fragen.

- ☐ ja
☐ nein

- 19 Wird das richtige Verhalten der Mitarbeitenden von den Vorgesetzten kontrolliert?

- ☐ ja
☐ teilweise
☐ nein



7 Zu einem regelkonformen Rollgerüst gehören: dreiteiliger korrekter Seitenschutz, tragfähige Beläge, Abstützung.

Hinweis zu Frage 15

Für eine Instruktion der Mitarbeitenden in der richtigen Handhabung des Rollgerüsts eignet sich der Faltprospekt «Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst» (www.suva.ch/84018.d).

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen. Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen zusätzlichen Massnahmen. Notieren Sie diese auf der letzten Seite.

Nr.	Zu erledigende Massnahme	Termin	beauftragte Person	erledigt		Bemerkungen	geprüft	
				Datum	Visum		Datum	Visum

(Empfehlung: täglich)

Publikationsnummer: 67150.d



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: Tel. 058 411 12 12, kundendienst@suva.ch
Download und Bestellungen: www.suva.ch/67150.d

Suva, Postfach, 6002 Luzern



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziert durch die EKAS
www.ekas.admin.ch
